



**AKTIV**  
**ATTRAKTIV**



## ORIENTERING OM STATUS I VANN- OG AVLØPSPROSJEKTER

PMU 26.04.2023

# INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



## 576 Oppvekstsenter Venn

Oppstart for detaljplan er varslet, høringsfrist 5. mai. Prosess med grunneier pågår, forventet ferdig i august. Arbeid med forberedelser for totalentreprise pågår.

# INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



Oppstart: 2023

Ferdigstilles: 2024

## 561 Aktivitetsparken i Buvika

Rådgivertjenester for detaljprosjektering må innhentes på nytt, konkurranse i april/mai.

# INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID



566 Buvik kirkegård

Se egen presentasjon.

Oppstart:

Vår 2023

Ferdigstilles:

2023/24

# INVESTERINGSPROSJEKTER UNDER ARBEID




Oppstart: 2023

Ferdigstilles: 2024

543 Ølsholmskjæret friområde

Se egen presentasjon.

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

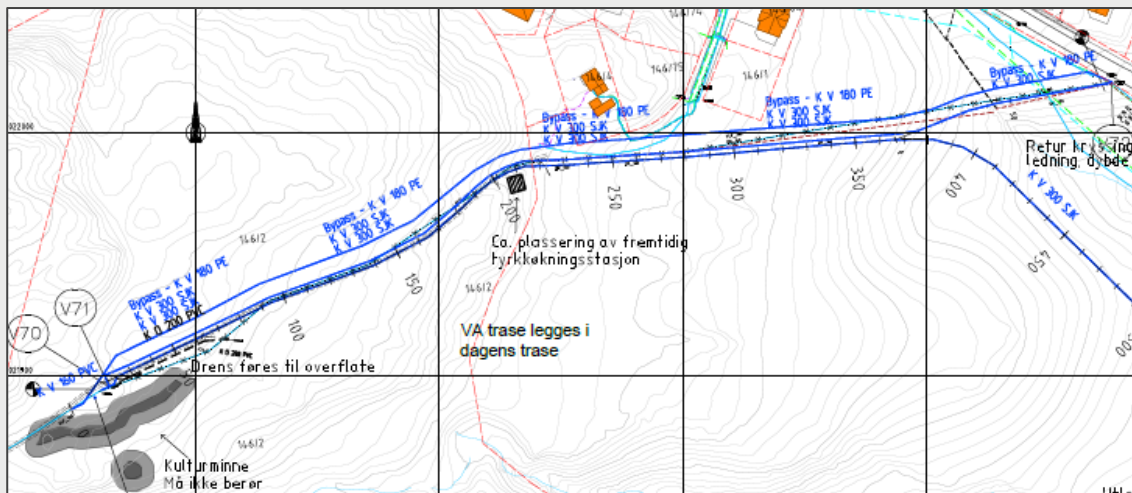

Oppstart:

Vår 2023

Ferdigstilles:

2023

## 662 Vassåsen høydebasseng

Prosjektering pågår, anslått byggestart i sommer 2023 med ferdigstillelse 1. januar 2023.

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID



656/754 Eggkleiva - Børsa

Arbeidene pågår.

Oppstart:

Oktober 2022

Ferdigstilles:

Høst 2024

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID



## 658 VA Trøvegen

Arbeider i Trøvegen er ferdigstilt, arbeider i Brautabakken pågår.

**Oppstart:**


Vår 2022

**Ferdigstilles:**

Sommer 2023



# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

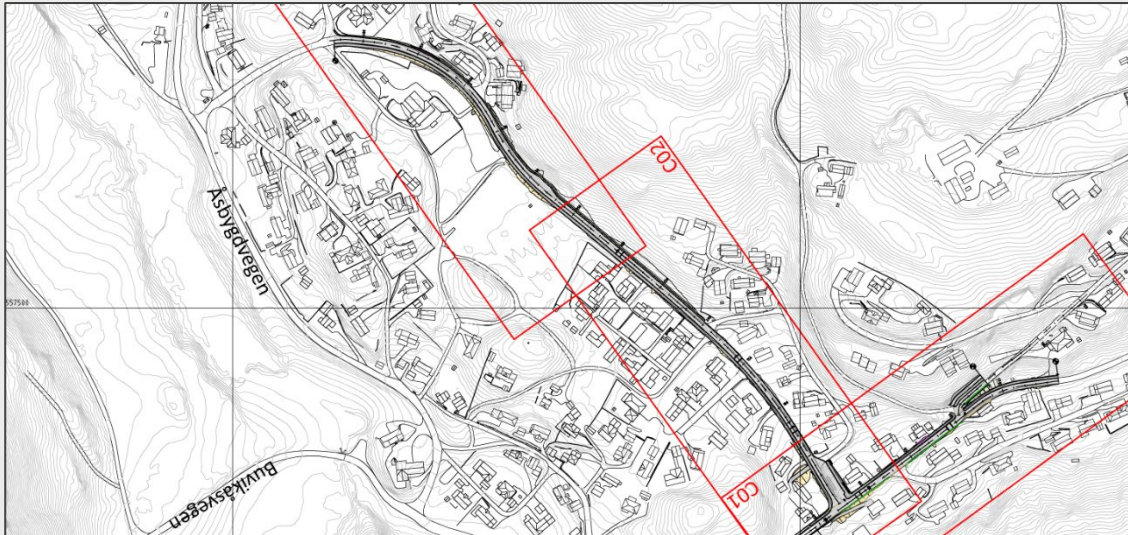

## 666 VA Finnmyrvegen

Veien er stengt, arbeidene pågår og vil vare ut året.


**Oppstart:**

Årsskifte 22/23

**Ferdigstilles:**

Høst 2023

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

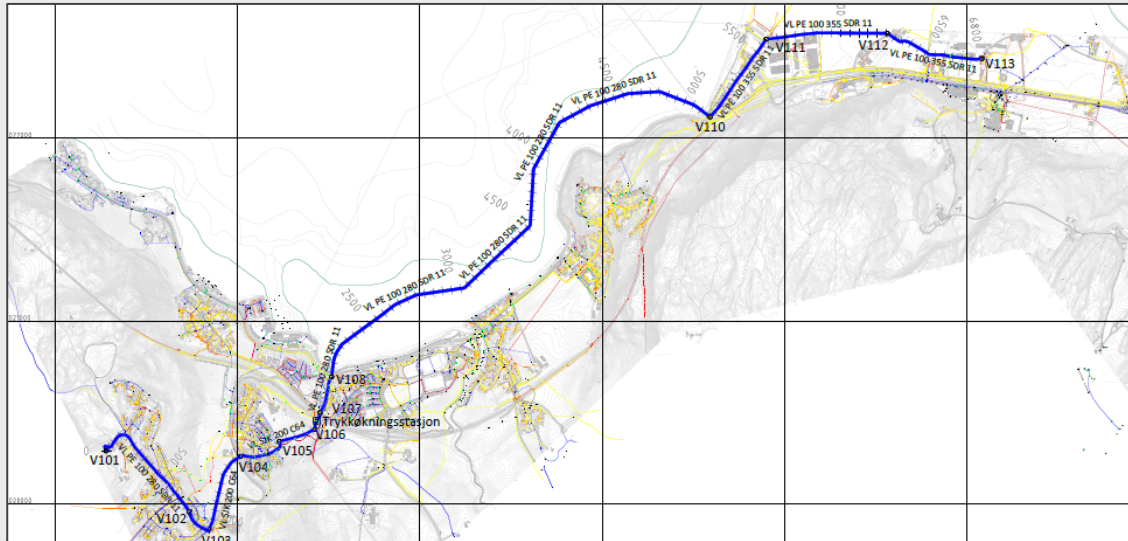

**Oppstart:**

Vår 2023?


**Ferdigstilles:**

Sommer 2024?

## 668 Reservevann

Arbeid med grunneieravtaler pågår, samt avtale med Trondheim kommune om MeTroVann. Første entreprise kan lyses ut når avtalene er på plass og nødvendige godkjenninger er i orden.

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

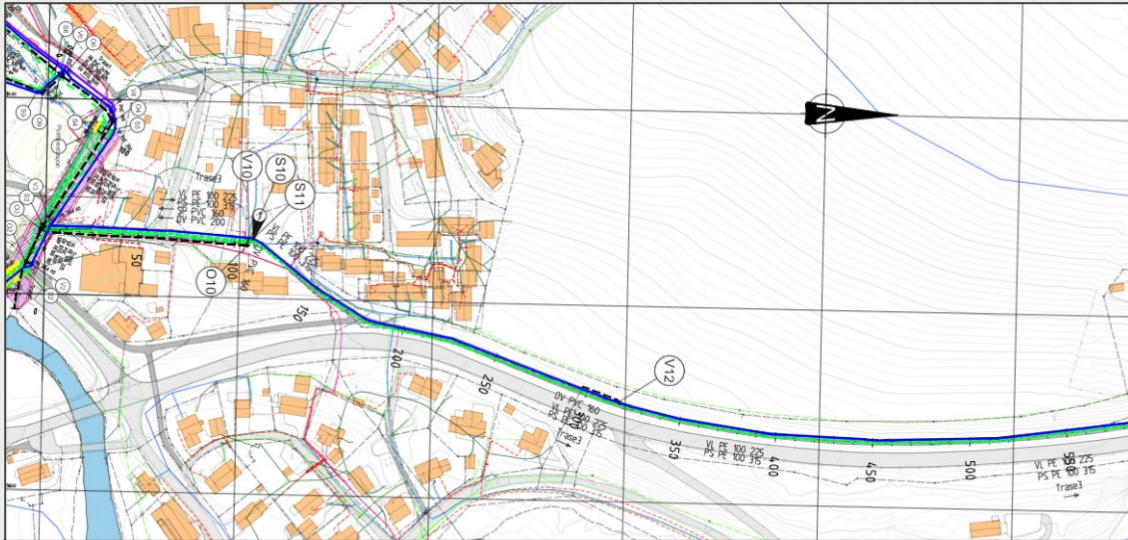

**Oppstart:**

Vår 2023?


**Ferdigstilles:**

Usikker

## 768 VA Børsa - Eliløkken

Resultatene på de supplerende grunnundersøkelsene viste langt verre grunnforhold enn håpet. Opprinnelig trasé vil være svært kostbar, ny trasé utredes. Dette innebærer nye grunnundersøkelser, disse ble utført i april.

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

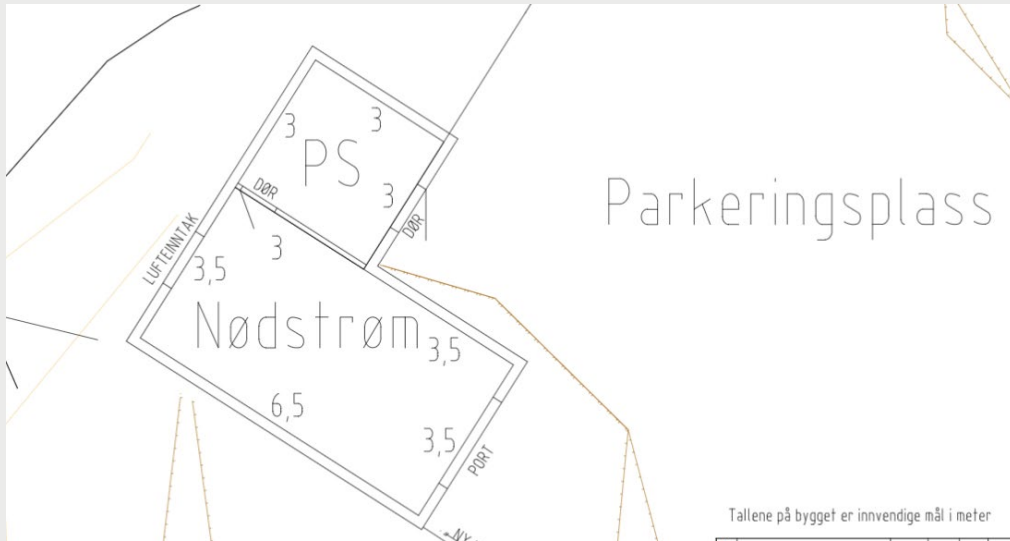

**Oppstart:**

Høst 2021

**Ferdigstilles:**

Usikker

## 770 VA Børsa sentrum

Entreprenør er kontrahert, men pumpestasjonen kan ikke settes i bestilling før trasé mot Eliløkken er avklart.

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID




## 729 Viggja renseanlegg

Grunnundersøkelser gjennomført, prosjektering pågår.

Oppstart: 2023?

Ferdigstilles: 2024

# VA-PROSJEKTER UNDER ARBEID

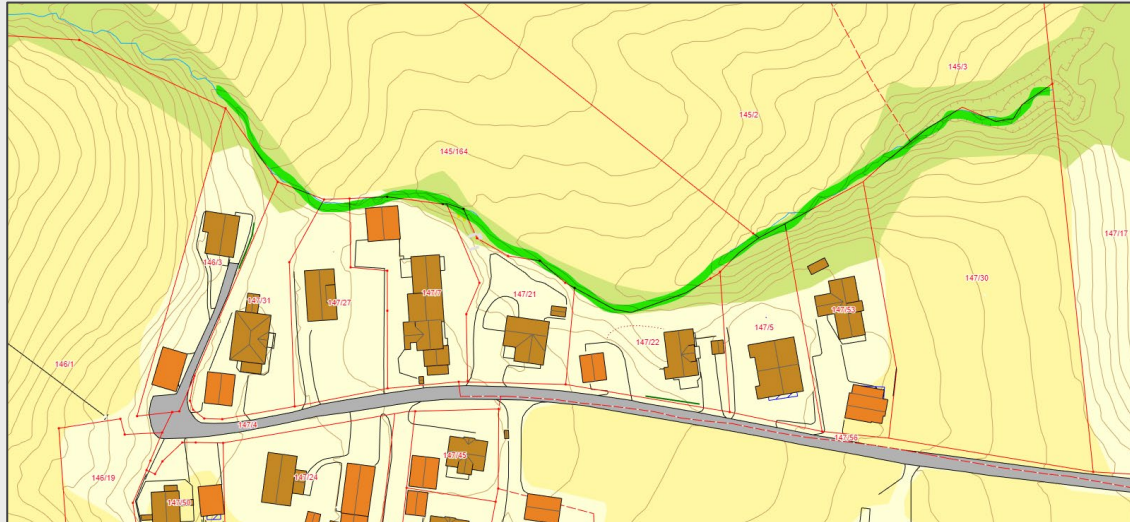

**Oppstart:**

Januar 2023

**Ferdigstilles:**

Mars 2023

Håggåbekken

Arbeidene er ferdigstilt.

